

LAPORAN MINGGUAN PERIODE KE-4 JULI 2021



PROYEK BOTANICAL PURI ASRI




STATUS KAVLING

Terjual 31

Booked 3

Pembangunan 3 unit Block D sementara

Pembangunan 3 unit Block G

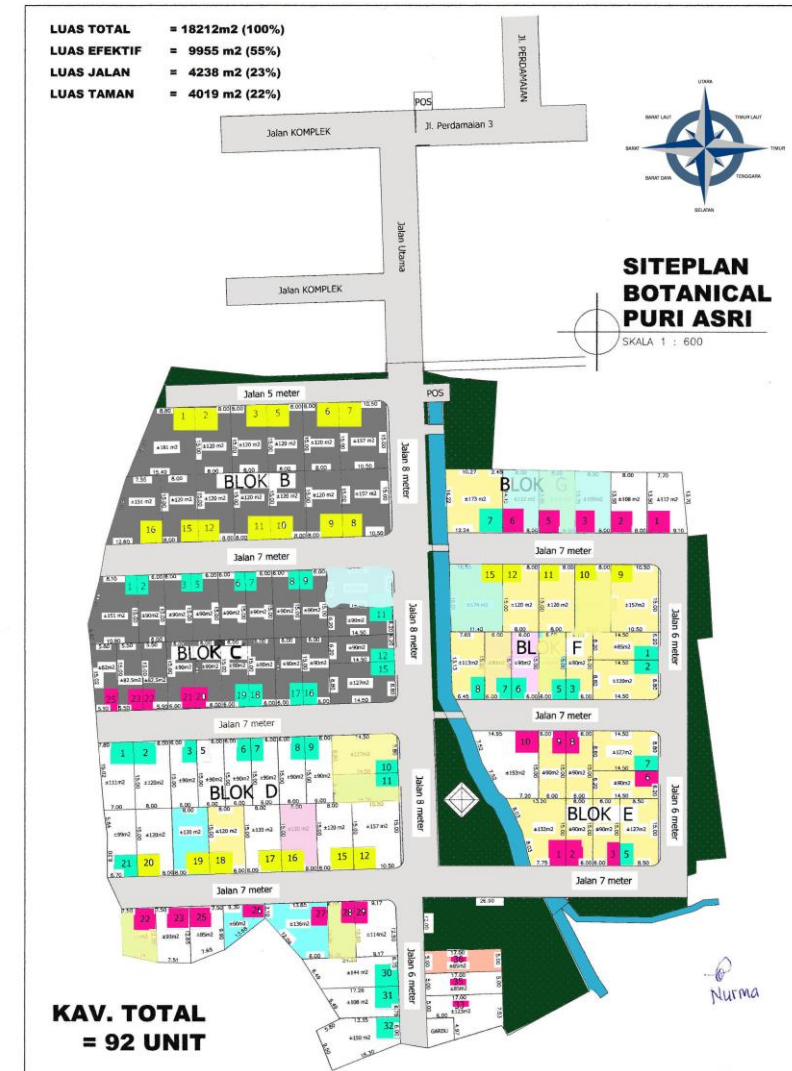

KET:

 TYPE ZAITUN	 BOOKED	7
 TYPE TIN	 SOLD	24
 TYPE BIDARA	 ON PROGRESS	
	 SHOW UNIT	

TEKNIK

A. PROGRESS PEMBANGUNAN UNIT PT. SJK

1. Tahap 1 Block G (Bidara)
 - a. G6 Persiapan Bekisting pelat lantai
 - b. G3 & G5 pekerjaan finishing dinding
2. Tahap 2 Block D (Bidara & Tin)
 - a. Pengecoran Pelat Lantai D10 & D22
 - b. Pengecoran Dak Talang D28
 - c. Unit berikutnya yang akan segera dibangun D23, D25, D9 dan C10
3. Rencana
 - a. D22 Tutup Atap minggu ke-2 Agustus'21 tidak tercapai kendala libur tukang
 - b. D28 Tutup Atap akhir minggu Ke-4 Juli tidak tercapai kendala libur tukang
4. Target
 - a. Install Genteng D28
 - b. Pencairan Addendum Ke -2 D22 (Rp.36.000.000,-)
 - c. Pencairan Addendum Ke-2 D28 (18.452.500,-)

NO	KAV	KEGIATAN	RENCANA	A
1	G3	Instal kusen pintu dan plester	Plester dan fasade depan	55.04
2	G5	Plester,finishing dak talang dan torn fasade depan	Plester dan fasade depan	57.11
3	G6	Melanjutkan Pas. Bata dan cor kolom	Bekisting & pabriksi besi balok	21,26
4	D22	Cor pelat lantai dan install besi, pipa airkotor dan bata	Pas. Bata lt. atas	28.09
5	D28	Bekisting, install dan cor dak talang dan pet	Install Bj Ringan, genteng dan plester	36.59
6	D10	Bekisting & pabriksi besi balok dan cor pelat lantai	Install pipa air kotor, Pas. Bata lt. atas	29.52

G (BIDARA)



D (BIDARA & TIN)



B. JAYA TEKNIK SARANA TELEMEDIA

1. Material belum semua diangkut



ESTATE

ESTATE MANAGEMENT

- Rencana
 - Perbaikan Lampu Jalan
 - Demo Felita
 - Follow up PDAM (Pemasangan)
 - Pembersian tanah untuk tanam umi di area fasum dan kavling kosong
- Target
 - Lampu Jalan Kembali Hidup
 - Pemasangan Kotak Sampah
 - Penanaman Ubi
- Kendala
 - PPKN



**TERIMA KASIH
SAMPAI JUMPA**

SALAM SEMANGAT
